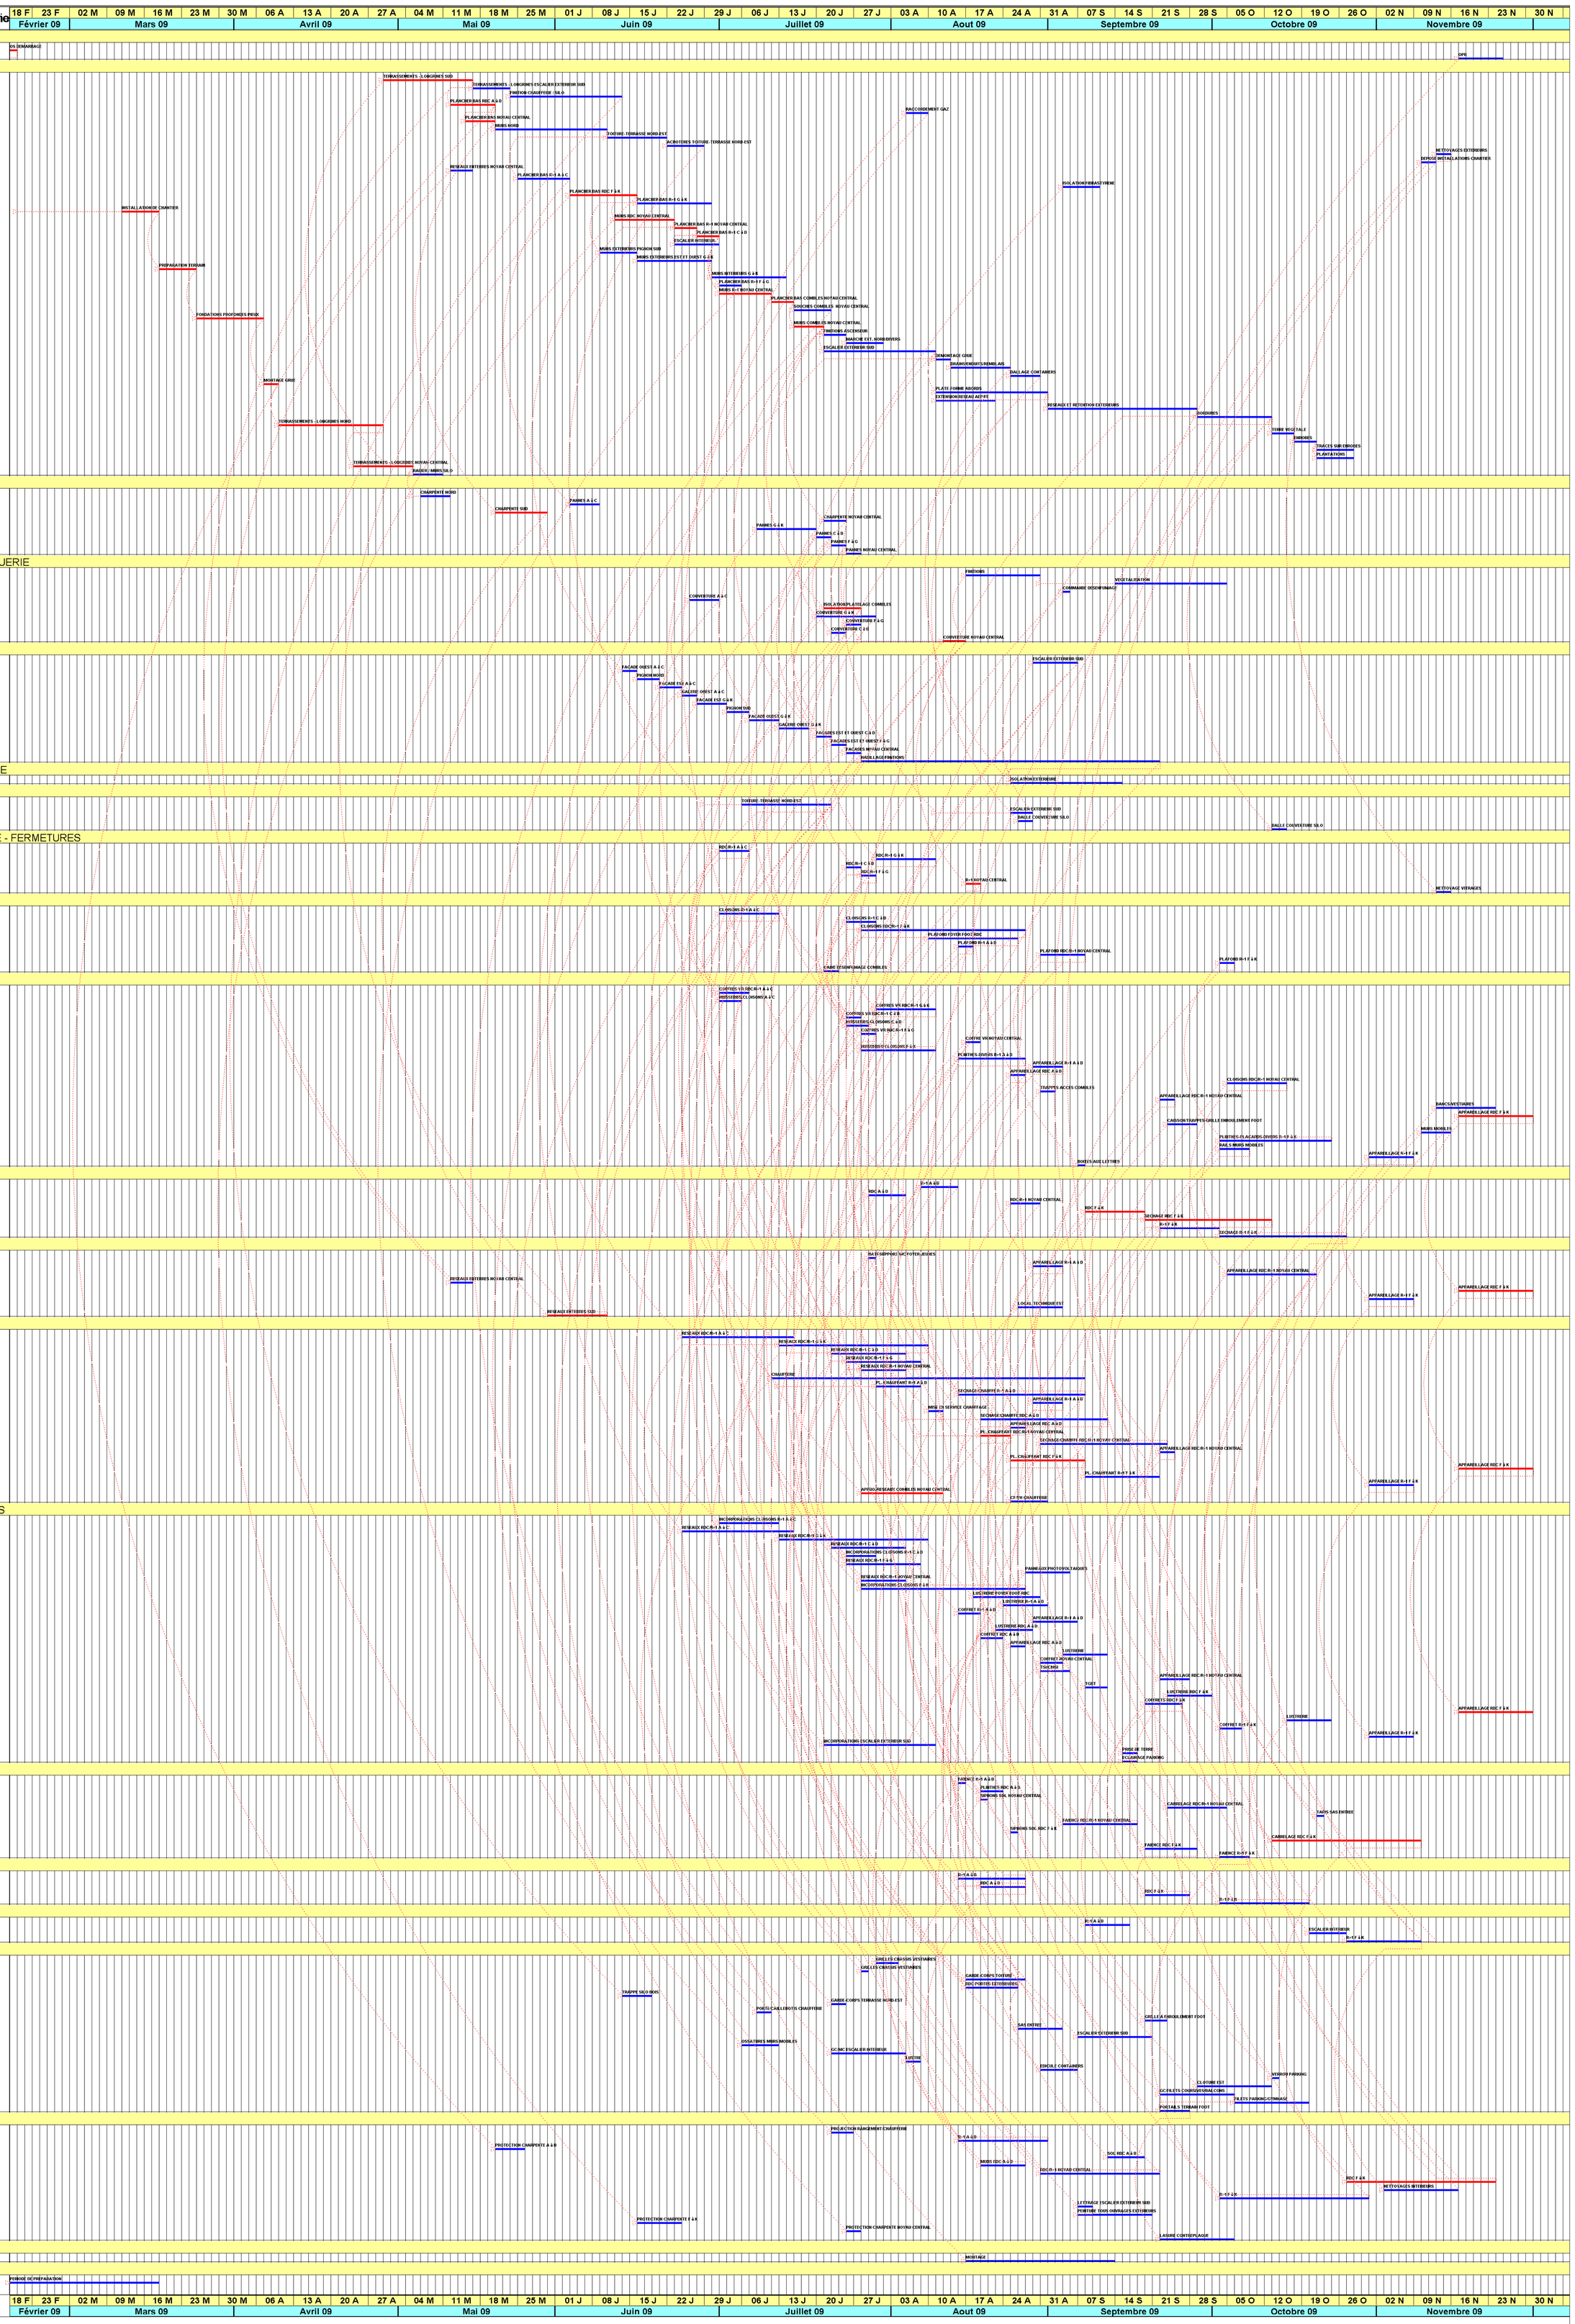| | | Durée | Début prévisionnel | Fin prévisionnelle | Ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAITRE D'OUVRAGE** | | | | | |
| 1 | OS DEMARRAGE | 18/02/09 | 18/02/09 | | 1 |
| 217 | OPR | 17/11/09 | 24/11/09 | | 6 |
| **1 : GROS-OEUVRE - ABORDS** | | | | | |
| 10 | TERRASSEMENTS | 29/04/09 | 14/05/09 | | 12 |
| 12 | TERRASSEMENTS | 15/05/09 | 21/05/09 | | 5 |
| 13 | FINITION CHAUFFE | 22/05/09 | 11/06/09 | | 15 |
| 15 | PLANCHER BAS R | 12/05/09 | 19/05/09 | | 6 |
| 161 | RACCORDEMENT | 05/06/09 | 07/06/09 | | 3 |
| 17 | PLANCHER BAS N | 14/05/09 | 19/05/09 | | 4 |
| 19 | MURS NORD | 20/05/09 | 09/06/09 | | 15 |
| 20 | TOITURE-TERRASS | 10/06/09 | 19/06/09 | | 8 |
| 21 | ACROTERES TOITU | 22/06/09 | 26/06/09 | | 5 |
| 216 | NETTOYAGES EXT | 12/11/09 | 13/11/09 | | 2 |
| 219 | DEPOSE INSTALLA | 10/11/09 | 11/11/09 | | 2 |
| 22 | RESEAUX ENTERR | 12/05/09 | 14/05/09 | | 3 |
| 23 | PLANCHER BAS R+ | 25/05/09 | 02/06/09 | | 7 |
| 234 | ISOLATION FIBRAS | 03/09/09 | 09/09/09 | | 5 |
| 26 | PLANCHER BAS R | 03/06/09 | 15/06/09 | | 9 |
| 28 | PLANCHER BAS R+ | 16/06/09 | 29/06/09 | | 10 |
| 3 | INSTALLATION DE | 11/03/09 | 17/03/09 | | 5 |
| 30 | MURS RDC NOYAU | 11/06/09 | 22/06/09 | | 8 |
| 31 | PLANCHER BAS R+ | 23/06/09 | 25/06/09 | | 3 |
| 32 | PLANCHER BAS R+ | 26/06/09 | 30/06/09 | | 3 |
| 34 | ESCALIER INTERIE | 23/06/09 | 30/06/09 | | 6 |
| 38 | MURS EXTERIEURS | 09/06/09 | 15/06/09 | | 5 |
| 39 | MURS EXTERIEURS | 16/06/09 | 29/06/09 | | 10 |
| 4 | PREPARATION TER | 18/03/09 | 24/03/09 | | 5 |
| 40 | MURS INTERIEURS | 30/06/09 | 13/07/09 | | 10 |
| 42 | PLANCHER BAS R+ | 01/07/09 | 03/07/09 | | 3 |
| 43 | MURS R+1 NOYAU | 01/07/09 | 09/07/09 | | 7 |
| 46 | PLANCHER BAS C | 10/07/09 | 14/07/09 | | 3 |
| 47 | SOUCHES COMBL | 15/07/09 | 21/07/09 | | 5 |
| 5 | FONDATIONS PRO | 25/03/09 | 06/04/09 | | 9 |
| 51 | MURS COMBLES N | 15/07/09 | 20/07/09 | | 4 |
| 52 | FINITIONS ASCENS | 21/07/09 | 23/07/09 | | 3 |
| 53 | MARCHE EXT. NOR | 24/07/09 | 30/07/09 | | 5 |
| 56 | ESCALIER EXTERIE | 21/07/09 | 19/08/09 | | 15 |
| 57 | DEMONTAGE GRU | 11/08/09 | 12/08/09 | | 2 |
| 58 | DRAINS/ENDUITS/R | 13/08/09 | 24/08/09 | | 8 |
| 59 | DALLAGE CONTAIN | 25/08/09 | 28/08/09 | | 4 |
| 6 | MONTAGE GRUE | 07/04/09 | 08/04/09 | | 2 |
| 64 | PLATE-FORME AB | 11/08/09 | 31/08/09 | | 15 |
| 66 | EXTENSION RESEA | 11/08/09 | 20/08/09 | | 8 |
| 67 | RESEAUX ET RETE | 01/09/09 | 28/09/09 | | 20 |
| 68 | BORDURES | 29/09/09 | 12/10/09 | | 10 |
| 7 | TERRASSEMENTS | 09/04/09 | 28/04/09 | | 14 |
| 72 | TERRE VEGETALE | 13/10/09 | 15/10/09 | | 3 |
| 73 | ENROBES | 16/10/09 | 20/10/09 | | 3 |
| 74 | TRACES SUR ENR | 21/10/09 | 27/10/09 | | 5 |
| 75 | PLANTATIONS | 21/10/09 | 27/10/09 | | 5 |
| 8 | TERRASSEMENTS | 23/04/09 | 04/05/09 | | 8 |
| 9 | RADIER / MURS SIL | 05/05/09 | 08/05/09 | | 4 |
| **2 : CHARPENTE METALLIQUE** | | | | | |
| 11 | CHARPENTE NORD | 06/05/09 | 11/05/09 | | 4 |
| 24 | PANNES A à C | 03/06/09 | 08/06/09 | | 4 |
| 50 | CHARPENTE SUD | 20/05/09 | 28/05/09 | | 7 |
| 54 | CHARPENTE NOYA | 21/07/09 | 23/07/09 | | 3 |
| 92 | PANNES G à K | 08/07/09 | 17/07/09 | | 8 |
| 94 | PANNES C à D | 20/07/09 | 21/07/09 | | 2 |
| 95 | PANNES F à G | 22/07/09 | 23/07/09 | | 2 |
| 98 | PANNES NOYAU C | 24/07/09 | 27/07/09 | | 2 |
| **3 : COUVERTURE VEGETALISEE - ZINGUERIE** | | | | | |
| 100 | FINITIONS | 17/08/09 | 26/08/09 | | 10 |
| 101 | VEGETALISATION | 14/09/09 | 02/10/09 | | 15 |
| 233 | COMMANDE DESE | 03/09/09 | 03/09/09 | | 1 |
| 45 | COUVERTURE A à | 25/06/09 | 30/06/09 | | 4 |
| 62 | ISOLATION/PLATEL | 21/07/09 | 27/07/09 | | 5 |
| 93 | COUVERTURE G à | 20/07/09 | 29/07/09 | | 8 |
| 96 | COUVERTURE F à | 24/07/09 | 27/07/09 | | 2 |
| 97 | COUVERTURE C à | 22/07/09 | 23/07/09 | | 2 |
| 99 | COUVERTURE NOY | 12/08/09 | 14/08/09 | | 3 |
| **4 : BARDAGE** | | | | | |
| 237 | ESCALIER EXTERIE | 28/08/09 | 04/09/09 | | 6 |
| 33 | FACADE OUEST A | 12/06/09 | 15/06/09 | | 2 |
| 35 | PIGNON NORD | 16/06/09 | 18/06/09 | | 3 |
| 36 | FACADE EST A à C | 19/06/09 | 23/06/09 | | 3 |
| 37 | GALERIE OUEST A | 24/06/09 | 25/06/09 | | 2 |
| 44 | FACADE EST G à K | 26/06/09 | 01/07/09 | | 4 |
| 78 | PIGNON SUD | 02/07/09 | 06/07/09 | | 3 |
| 79 | FACADE OUEST G | 07/07/09 | 10/07/09 | | 4 |
| 80 | GALERIE OUEST G | 13/07/09 | 16/07/09 | | 4 |
| 81 | FACADES EST ET | 20/07/09 | 21/07/09 | | 2 |
| 83 | FACADES EST ET | 22/07/09 | 23/07/09 | | 2 |
| 84 | FACADES NOYAU | 24/07/09 | 27/07/09 | | 2 |
| 85 | HABILLAGE/FINITIO | 28/07/09 | 21/09/09 | | 40 |
| **5 : ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE** | | | | | |
| 86 | ISOLATION EXTERI | 25/08/09 | 14/09/09 | | 15 |
| **6 : ETANCHEITE** | | | | | |
| 140 | TOITURE-TERRASS | 06/07/09 | 21/07/09 | | 12 |
| 236 | ESCALIER EXTERIE | 25/08/09 | 27/08/09 | | 3 |
| 65 | DALLE COUVERTU | 26/08/09 | 27/08/09 | | 2 |
| 69 | DALLE COUVERTU | 13/10/09 | 14/10/09 | | 2 |
| **7 : MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE - FERMETURES** | | | | | |
| 103 | RDC/R+1 A à C | 01/07/09 | 06/07/09 | | 4 |
| 111 | RDC/R+1 G à K | 30/07/09 | 10/08/09 | | 8 |
| 117 | RDC/R+1 C à D | 24/07/09 | 27/07/09 | | 2 |
| 123 | RDC/R+1 F à G | 28/07/09 | 29/07/09 | | 2 |
| 129 | R+1 NOYAU CENTR | 17/08/09 | 18/08/09 | | 2 |
| 214 | NETTOYAGE VITRA | 12/11/09 | 13/11/09 | | 2 |
| **8 : CLOISONNEMENTS - DOUBLAGES** | | | | | |
| 105 | CLOISONS R+1 A à | 01/07/09 | 10/07/09 | | 8 |
| 119 | CLOISONS R+1 C à | 24/07/09 | 29/07/09 | | 4 |
| 135 | CLOISONS RDC/R+ | 28/07/09 | 26/08/09 | | 22 |
| 138 | PLAFOND FOYER F | 10/08/09 | 25/08/09 | | 12 |
| 154 | PLAFOND R+1 A à | 14/08/09 | 17/08/09 | | 2 |
| 182 | PLAFOND RDC/R+1 | 31/08/09 | 07/09/09 | | 6 |
| 221 | PLAFOND R+1 F à | 02/10/09 | 05/10/09 | | 2 |
| 63 | GAINE DESENFUM | 21/07/09 | 22/07/09 | | 2 |
| **9 : MENUISERIE BOIS** | | | | | |
| 102 | COFFRES VR RDC/ | 01/07/09 | 06/07/09 | | 4 |
| 104 | HUISSERIES CLOIS | 01/07/09 | 03/07/09 | | 3 |
| 112 | COFFRES VR RDC/ | 30/07/09 | 10/08/09 | | 8 |
| 116 | COFFRES VR RDC/ | 24/07/09 | 27/07/09 | | 2 |
| 118 | HUISSERIES CLOIS | 24/07/09 | 28/07/09 | | 3 |
| 124 | COFFRES VR RDC/ | 28/07/09 | 29/07/09 | | 2 |
| 131 | COFFRE VR NOYA | 17/08/09 | 18/08/09 | | 2 |
| 134 | HUISSERIES CLOIS | 28/07/09 | 10/08/09 | | 10 |
| 148 | PLINTHES-DIVERS | 14/08/09 | 26/08/09 | | 9 |
| 156 | APPAREILLAGE R+ | 28/08/09 | 02/09/09 | | 4 |
| 170 | APPAREILLAGE RD | 25/08/09 | 26/08/09 | | 2 |
| 178 | CLOISONS RDC/R+ | 05/10/09 | 14/10/09 | | 8 |
| 181 | TRAPPES ACCES | 31/08/09 | 01/09/09 | | 2 |
| 188 | APPAREILLAGE RD | 22/09/09 | 23/09/09 | | 2 |
| 198 | BANCS/VESTIAIRE | 12/11/09 | 23/11/09 | | 8 |
| 203 | APPAREILLAGE RD | 17/11/09 | 30/11/09 | | 10 |
| 208 | CAISSON/TRAPPE | 23/09/09 | 28/09/09 | | 4 |
| 218 | MURS MOBILES | 10/11/09 | 13/11/09 | | 4 |
| 220 | PLINTHES-PLACAR | 02/10/09 | 22/10/09 | | 15 |
| 226 | RAILS MURS MOBI | 02/10/09 | 07/10/09 | | 4 |
| 228 | APPAREILLAGE R+ | 30/10/09 | 06/11/09 | | 6 |
| 238 | BOITES AUX LETTR | 07/09/09 | 07/09/09 | | 1 |
| **10 : CHAPES** | | | | | |
| 146 | R+1 A à D | 07/08/09 | 13/08/09 | | 5 |
| 160 | RDC A à D | 29/07/09 | 04/08/09 | | 5 |
| 175 | RDC/R+1 NOYAU C | 25/08/09 | 28/08/09 | | 4 |
| 192 | RDC F à K | 08/09/09 | 17/09/09 | | 8 |
| 195 | SECHAGE RDC F à | 18/09/09 | 12/10/09 | | 17 |
| 210 | R+1 F à K | 22/09/09 | 01/10/09 | | 8 |
| 211 | SECHAGE R+1 F à | 02/10/09 | 26/10/09 | | 17 |
| **11 : PLOMBERIE - SANITAIRE** | | | | | |
| 137 | BATI-SUPPORT WC | 29/07/09 | 29/07/09 | | 1 |
| 157 | APPAREILLAGE R+ | 28/08/09 | 02/09/09 | | 4 |
| 179 | APPAREILLAGE RD | 05/10/09 | 20/10/09 | | 12 |
| 18 | RESEAUX ENTERR | 12/05/09 | 14/05/09 | | 3 |
| 204 | APPAREILLAGE RD | 17/11/09 | 30/11/09 | | 10 |
| 229 | APPAREILLAGE R+ | 30/10/09 | 06/11/09 | | 6 |
| 235 | LOCAL TECHNIQUE | 26/08/09 | 02/09/09 | | 6 |
| 25 | RESEAUX ENTERR | 29/05/09 | 09/06/09 | | 8 |
| **12 : CHAUFFAGE - VENTILATION** | | | | | |
| 107 | RESEAUX RDC/R+1 | 24/06/09 | 14/07/09 | | 15 |
| 109 | RESEAUX RDC/R+1 | 13/07/09 | 07/08/09 | | 20 |
| 114 | RESEAUX RDC/R+1 | 22/07/09 | 04/08/09 | | 10 |
| 121 | RESEAUX RDC/R+1 | 24/07/09 | 06/08/09 | | 10 |
| 132 | RESEAUX RDC/R+1 | 28/07/09 | 04/08/09 | | 6 |
| 144 | CHAUFFERIE | 10/07/09 | 07/09/09 | | 42 |
| 145 | PL. CHAUFFANT R+ | 30/07/09 | 06/08/09 | | 6 |
| 147 | SECHAGE/CHAUFF | 14/08/09 | 07/09/09 | | 17 |
| 158 | APPAREILLAGE R+ | 28/08/09 | 02/09/09 | | 4 |
| 162 | MISE EN SERVICE | 10/08/09 | 11/08/09 | | 2 |
| 163 | SECHAGE/CHAUFF | 19/08/09 | 10/09/09 | | 17 |
| 171 | APPAREILLAGE RD | 25/08/09 | 26/08/09 | | 2 |
| 173 | PL. CHAUFFANT R | 19/08/09 | 24/08/09 | | 4 |
| 176 | SECHAGE/CHAUFF | 31/08/09 | 22/09/09 | | 17 |
| 189 | APPAREILLAGE RD | 22/09/09 | 23/09/09 | | 2 |
| 191 | PL. CHAUFFANT R | 25/08/09 | 07/09/09 | | 10 |
| 205 | APPAREILLAGE RD | 17/11/09 | 30/11/09 | | 10 |
| 209 | PL. CHAUFFANT R+ | 08/09/09 | 21/09/09 | | 10 |
| 230 | APPAREILLAGE R+ | 30/10/09 | 06/11/09 | | 6 |
| 82 | APPRO./RESEAUX | 28/07/09 | 11/08/09 | | 11 |
| 87 | CFA/H CHAUFFERI | 25/08/09 | 31/08/09 | | 5 |
| **13 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES** | | | | | |
| 106 | INCORPORATIONS | 01/07/09 | 10/07/09 | | 8 |
| 108 | RESEAUX RDC/R+1 | 24/06/09 | 14/07/09 | | 15 |
| 110 | RESEAUX RDC/R+1 | 13/07/09 | 07/08/09 | | 20 |
| 115 | RESEAUX RDC/R+1 | 22/07/09 | 04/08/09 | | 10 |
| 120 | INCORPORATIONS | 24/07/09 | 29/07/09 | | 4 |
| 122 | RESEAUX RDC/R+1 | 24/07/09 | 06/08/09 | | 10 |
| 128 | PANNEAUX PHOTO | 27/08/09 | 03/09/09 | | 6 |
| 133 | RESEAUX RDC/R+1 | 28/07/09 | 04/08/09 | | 6 |
| 136 | INCORPORATIONS | 28/07/09 | 26/08/09 | | 22 |
| 139 | LUSTRERIE FOYER | 18/08/09 | 26/08/09 | | 9 |
| 150 | LUSTRERIE R+1 A | 24/08/09 | 31/08/09 | | 6 |
| 155 | COFFRET R+1 A à | 14/08/09 | 18/08/09 | | 3 |
| 159 | APPAREILLAGE R+ | 28/08/09 | 04/09/09 | | 6 |
| 167 | LUSTRERIE RDC A | 21/08/09 | 27/08/09 | | 5 |
| 169 | COFFRET RDC A à | 19/08/09 | 21/08/09 | | 3 |
| 172 | APPAREILLAGE RD | 25/08/09 | 26/08/09 | | 2 |
| 185 | LUSTRERIE | 03/09/09 | 10/09/09 | | 6 |
| 186 | COFFRET NOYAU | 31/08/09 | 02/09/09 | | 3 |
| 187 | TSI/CMSI | 31/08/09 | 03/09/09 | | 4 |
| 190 | APPAREILLAGE RD | 22/09/09 | 25/09/09 | | 4 |
| 193 | TGBT | 08/09/09 | 10/09/09 | | 3 |
| 201 | LUSTRERIE RDC F | 23/09/09 | 30/09/09 | | 6 |
| 202 | COFFRETS RDC F | 18/09/09 | 24/09/09 | | 5 |
| 206 | APPAREILLAGE RD | 17/11/09 | 30/11/09 | | 10 |
| 223 | LUSTRERIE | 15/10/09 | 22/10/09 | | 6 |
| 227 | COFFRET R+1 F à | 02/10/09 | 06/10/09 | | 3 |
| 231 | APPAREILLAGE R+ | 30/10/09 | 06/11/09 | | 6 |
| 61 | INCORPORATIONS | 21/07/09 | 10/08/09 | | 15 |
| 76 | PRISE DE TERRE | 15/09/09 | 16/09/09 | | 2 |
| 77 | ECLAIRAGE PARKI | 15/09/09 | 16/09/09 | | 2 |
| **14 : CARRELAGE - FAIENCE** | | | | | |
| 153 | FAIENCE R+1 A à D | 14/08/09 | 14/08/09 | | 1 |
| 165 | PLINTHES RDC A à | 19/08/09 | 21/08/09 | | 3 |
| 174 | SIPHONS SOL NOY | 19/08/09 | 19/08/09 | | 1 |
| 177 | CARRELAGE RDC/ | 23/09/09 | 02/10/09 | | 8 |
| 180 | TAPIS SAS ENTRE | 21/10/09 | 21/10/09 | | 1 |
| 184 | FAIENCE RDC/R+1 | 03/09/09 | 16/09/09 | | 10 |
| 194 | SIPHONS SOL RDC | 25/08/09 | 25/09/09 | | 1 |
| 196 | CARRELAGE RDC | 13/10/09 | 09/11/09 | | 20 |
| 199 | FAIENCE RDC F à | 18/09/09 | 28/09/09 | | 7 |
| 224 | FAIENCE R+1 F à K | 02/10/09 | 07/10/09 | | 4 |
| **15 : PLAFONDS SUSPENDUS** | | | | | |
| 149 | R+1 A à D | 14/08/09 | 26/08/09 | | 9 |
| 166 | RDC A à D | 19/08/09 | 26/08/09 | | 6 |
| 200 | RDC F à K | 18/09/09 | 25/09/09 | | 6 |
| 222 | R+1 F à K | 02/10/09 | 19/10/09 | | 12 |
| **16 : SOLS COLLES** | | | | | |
| 151 | R+1 A à D | 08/09/09 | 15/09/09 | | 6 |
| 212 | ESCALIER INTERIE | 20/10/09 | 26/10/09 | | 5 |
| 213 | R+1 F à K | 27/10/09 | 09/11/09 | | 10 |
| **17 : SERRURERIE** | | | | | |
| 113 | GRILLES CHASSIS | 30/07/09 | 03/08/09 | | 3 |
| 125 | GRILLES CHASSIS | 28/07/09 | 28/07/09 | | 1 |
| 127 | GARDE-CORPS TOI | 17/08/09 | 26/08/09 | | 8 |
| 130 | RDC PORTES EXTE | 17/08/09 | 25/08/09 | | 7 |
| 14 | TRAPPE SILO BOIS | 12/06/09 | 17/06/09 | | 4 |
| 142 | GARDE-CORPS TE | 22/07/09 | 23/07/09 | | 2 |
| 143 | PORTE/CAILLEBOTI | 08/07/09 | 09/07/09 | | 2 |
| 207 | GRILLE A ENROUL | 18/09/09 | 22/09/09 | | 3 |
| 232 | SAS ENTREE | 26/08/09 | 02/09/09 | | 6 |
| 239 | ESCALIER EXTERIE | 07/09/09 | 18/09/09 | | 10 |
| 41 | OSSATURES MURS | 06/07/09 | 10/07/09 | | 5 |
| 48 | GC/MC ESCALIER I | 22/07/09 | 04/09/09 | | 10 |
| 49 | LUSTRE | 05/08/09 | 06/08/09 | | 2 |
| 60 | EDICULE CONTAIN | 31/08/09 | 04/09/09 | | 5 |
| 70 | VERROU PARKING | 13/10/09 | 13/10/09 | | 1 |
| 71 | CLOTURE EST | 29/09/09 | 12/10/09 | | 10 |
| 88 | GC/FILETS COURS | 22/09/09 | 05/10/09 | | 10 |
| 89 | FILETS PARKING/G | 06/10/09 | 19/10/09 | | 10 |
| 90 | PORTAILS TERRAIN | 22/09/09 | 25/09/09 | | 4 |
| **18 : PEINTURE** | | | | | |
| 141 | PROJECTION RANG | 22/07/09 | 24/07/09 | | 3 |
| 152 | R+1 A à D | 14/08/09 | 31/08/09 | | 12 |
| 16 | PROTECTION CHAR | 20/05/09 | 25/05/09 | | 4 |
| 164 | SOL RDC A à D | 11/09/09 | 17/09/09 | | 5 |
| 168 | MURS RDC A à D | 19/08/09 | 26/08/09 | | 6 |
| 183 | RDC/R+1 NOYAU C | 31/08/09 | 21/09/09 | | 16 |
| 197 | RDC F à K | 27/10/09 | 23/11/09 | | 20 |
| 216 | NETTOYAGES INTE | 03/11/09 | 16/11/09 | | 10 |
| 225 | R+1 F à K | 02/10/09 | 29/10/09 | | 20 |
| 240 | LETTRAGE ESCALI | 07/09/09 | 08/09/09 | | 2 |
| 241 | PEINTURE TOUS O | 07/09/09 | 18/09/09 | | 10 |
| 27 | PROTECTION CHAR | 16/06/09 | 23/06/09 | | 6 |
| 55 | PROTECTION CHAR | 24/07/09 | 27/07/09 | | 2 |
| 91 | LASURE CONTREPL | 22/09/09 | 05/10/09 | | 10 |
| **19 : ASCENSEUR** | | | | | |
| 126 | MONTAGE | 17/08/09 | 11/09/09 | | 20 |
| **TOUS CORPS D'ETAT** | | | | | |
| 2 | PERIODE DE PREP | 18/02/09 | 17/03/09 | | 20 |
