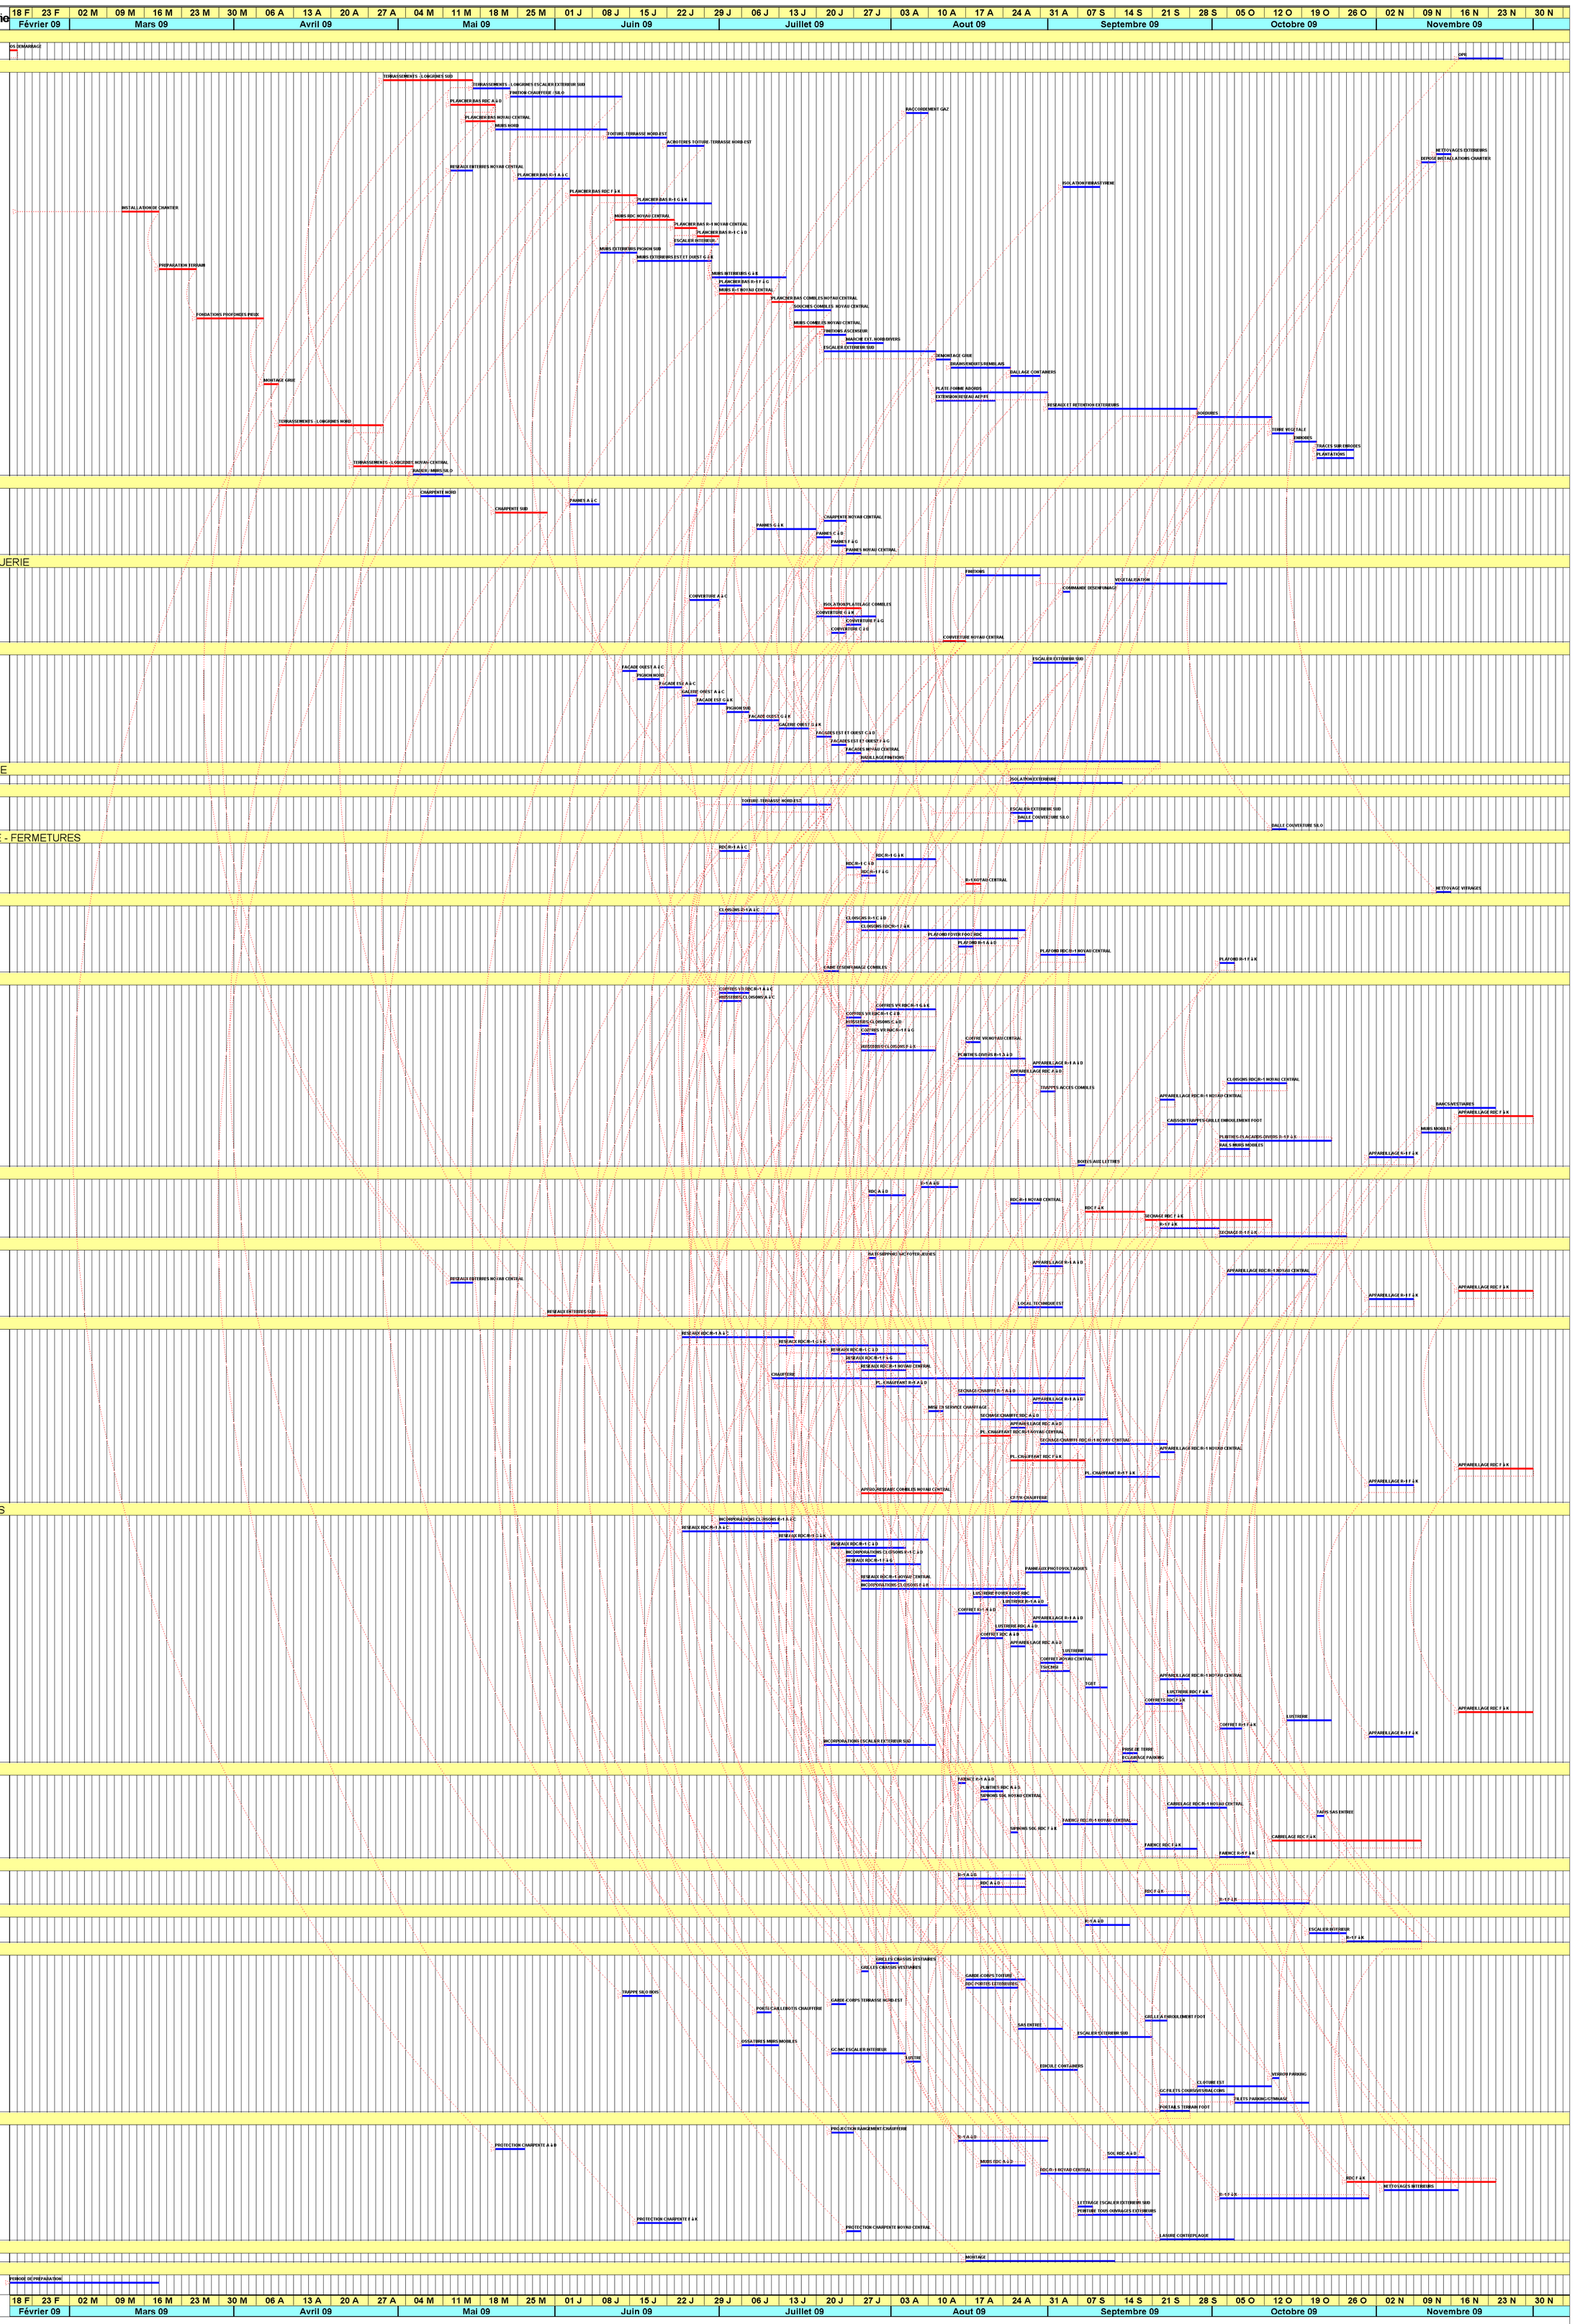		Durée	Début prévisionnel	Fin prévisionnelle	Ressources
MAITRE D'OUVRAGE					
1	OS DEMARRAGE	18/02/09	18/02/09		1
217	OPR	17/11/09	24/11/09		6
1 : GROS-OEUVRE - ABORDS					
10	TERRASSEMENTS	29/04/09	14/05/09		12
12	TERRASSEMENTS	15/05/09	21/05/09		5
13	FINITION CHAUFFE	22/05/09	11/06/09		15
15	PLANCHER BAS R	12/05/09	19/05/09		6
161	RACCORDEMENT	05/06/09	07/06/09		3
17	PLANCHER BAS N	14/05/09	19/05/09		4
19	MURS NORD	20/05/09	09/06/09		15
20	TOITURE-TERRASS	10/06/09	19/06/09		8
21	ACROTERES TOITU	22/06/09	26/06/09		5
216	NETTOYAGES EXT	12/11/09	13/11/09		2
219	DEPOSE INSTALLA	10/11/09	11/11/09		2
22	RESEAUX ENTERR	12/05/09	14/05/09		3
23	PLANCHER BAS R+	25/05/09	02/06/09		7
234	ISOLATION FIBRAS	03/09/09	09/09/09		5
26	PLANCHER BAS R	03/06/09	15/06/09		9
28	PLANCHER BAS R+	16/06/09	29/06/09		10
3	INSTALLATION DE	11/03/09	17/03/09		5
30	MURS RDC NOYAU	11/06/09	22/06/09		8
31	PLANCHER BAS R+	23/06/09	25/06/09		3
32	PLANCHER BAS R+	26/06/09	30/06/09		3
34	ESCALIER INTERIE	23/06/09	30/06/09		6
38	MURS EXTERIEURS	09/06/09	15/06/09		5
39	MURS EXTERIEURS	16/06/09	29/06/09		10
4	PREPARATION TER	18/03/09	24/03/09		5
40	MURS INTERIEURS	30/06/09	13/07/09		10
42	PLANCHER BAS R+	01/07/09	03/07/09		3
43	MURS R+1 NOYAU	01/07/09	09/07/09		7
46	PLANCHER BAS C	10/07/09	14/07/09		3
47	SOUCHES COMBL	15/07/09	21/07/09		5
5	FONDATIONS PRO	25/03/09	06/04/09		9
51	MURS COMBLES N	15/07/09	20/07/09		4
52	FINITIONS ASCENS	21/07/09	23/07/09		3
53	MARCHE EXT. NOR	24/07/09	30/07/09		5
56	ESCALIER EXTERIE	21/07/09	19/08/09		15
57	DEMONTAGE GRU	11/08/09	12/08/09		2
58	DRAINS/ENDUITS/R	13/08/09	24/08/09		8
59	DALLAGE CONTAIN	25/08/09	28/08/09		4
6	MONTAGE GRUE	07/04/09	08/04/09		2
64	PLATE-FORME AB	11/08/09	31/08/09		15
66	EXTENSION RESEA	11/08/09	20/08/09		8
67	RESEAUX ET RETE	01/09/09	28/09/09		20
68	BORDURES	29/09/09	12/10/09		10
7	TERRASSEMENTS	09/04/09	28/04/09		14
72	TERRE VEGETALE	13/10/09	15/10/09		3
73	ENROBES	16/10/09	20/10/09		3
74	TRACES SUR ENR	21/10/09	27/10/09		5
75	PLANTATIONS	21/10/09	27/10/09		5
8	TERRASSEMENTS	23/04/09	04/05/09		8
9	RADIER / MURS SIL	05/05/09	08/05/09		4
2 : CHARPENTE METALLIQUE					
11	CHARPENTE NORD	06/05/09	11/05/09		4
24	PANNES A à C	03/06/09	08/06/09		4
50	CHARPENTE SUD	20/05/09	28/05/09		7
54	CHARPENTE NOYA	21/07/09	23/07/09		3
92	PANNES G à K	08/07/09	17/07/09		8
94	PANNES C à D	20/07/09	21/07/09		2
95	PANNES F à G	22/07/09	23/07/09		2
98	PANNES NOYAU C	24/07/09	27/07/09		2
3 : COUVERTURE VEGETALISEE - ZINGUERIE					
100	FINITIONS	17/08/09	26/08/09		10
101	VEGETALISATION	14/09/09	02/10/09		15
233	COMMANDE DESE	03/09/09	03/09/09		1
45	COUVERTURE A à	25/06/09	30/06/09		4
62	ISOLATION/PLATEL	21/07/09	27/07/09		5
93	COUVERTURE G à	20/07/09	29/07/09		8
96	COUVERTURE F à	24/07/09	27/07/09		2
97	COUVERTURE C à	22/07/09	23/07/09		2
99	COUVERTURE NOY	12/08/09	14/08/09		3
4 : BARDAGE					
237	ESCALIER EXTERIE	28/08/09	04/09/09		6
33	FACADE OUEST A	12/06/09	15/06/09		2
35	PIGNON NORD	16/06/09	18/06/09		3
36	FACADE EST A à C	19/06/09	23/06/09		3
37	GALERIE OUEST A	24/06/09	25/06/09		2
44	FACADE EST G à K	26/06/09	01/07/09		4
78	PIGNON SUD	02/07/09	06/07/09		3
79	FACADE OUEST G	07/07/09	10/07/09		4
80	GALERIE OUEST G	13/07/09	16/07/09		4
81	FACADES EST ET	20/07/09	21/07/09		2
83	FACADES EST ET	22/07/09	23/07/09		2
84	FACADES NOYAU	24/07/09	27/07/09		2
85	HABILLAGE/FINITIO	28/07/09	21/09/09		40
5 : ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE					
86	ISOLATION EXTERI	25/08/09	14/09/09		15
6 : ETANCHEITE					
140	TOITURE-TERRASS	06/07/09	21/07/09		12
236	ESCALIER EXTERIE	25/08/09	27/08/09		3
65	DALLE COUVERTU	26/08/09	27/08/09		2
69	DALLE COUVERTU	13/10/09	14/10/09		2
7 : MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE - FERMETURES					
103	RDC/R+1 A à C	01/07/09	06/07/09		4
111	RDC/R+1 G à K	30/07/09	10/08/09		8
117	RDC/R+1 C à D	24/07/09	27/07/09		2
123	RDC/R+1 F à G	28/07/09	29/07/09		2
129	R+1 NOYAU CENTR	17/08/09	18/08/09		2
214	NETTOYAGE VITRA	12/11/09	13/11/09		2
8 : CLOISONNEMENTS - DOUBLAGES					
105	CLOISONS R+1 A à	01/07/09	10/07/09		8
119	CLOISONS R+1 C à	24/07/09	29/07/09		4
135	CLOISONS RDC/R+	28/07/09	26/08/09		22
138	PLAFOND FOYER F	10/08/09	25/08/09		12
154	PLAFOND R+1 A à	14/08/09	17/08/09		2
182	PLAFOND RDC/R+1	31/08/09	07/09/09		6
221	PLAFOND R+1 F à	02/10/09	05/10/09		2
63	GAINE DESENFUM	21/07/09	22/07/09		2
9 : MENUISERIE BOIS					
102	COFFRES VR RDC/	01/07/09	06/07/09		4
104	HUISSERIES CLOIS	01/07/09	03/07/09		3
112	COFFRES VR RDC/	30/07/09	10/08/09		8
116	COFFRES VR RDC/	24/07/09	27/07/09		2
118	HUISSERIES CLOIS	24/07/09	28/07/09		3
124	COFFRES VR RDC/	28/07/09	29/07/09		2
131	COFFRE VR NOYA	17/08/09	18/08/09		2
134	HUISSERIES CLOIS	28/07/09	10/08/09		10
148	PLINTHES-DIVERS	14/08/09	26/08/09		9
156	APPAREILLAGE R+	28/08/09	02/09/09		4
170	APPAREILLAGE RD	25/08/09	26/08/09		2
178	CLOISONS RDC/R+	05/10/09	14/10/09		8
181	TRAPPES ACCES	31/08/09	01/09/09		2
188	APPAREILLAGE RD	22/09/09	23/09/09		2
198	BANCS/VESTIAIRE	12/11/09	23/11/09		8
203	APPAREILLAGE RD	17/11/09	30/11/09		10
208	CAISSON/TRAPPE	23/09/09	28/09/09		4
218	MURS MOBILES	10/11/09	13/11/09		4
220	PLINTHES-PLACAR	02/10/09	22/10/09		15
226	RAILS MURS MOBI	02/10/09	07/10/09		4
228	APPAREILLAGE R+	30/10/09	06/11/09		6
238	BOITES AUX LETTR	07/09/09	07/09/09		1
10 : CHAPES					
146	R+1 A à D	07/08/09	13/08/09		5
160	RDC A à D	29/07/09	04/08/09		5
175	RDC/R+1 NOYAU C	25/08/09	28/08/09		4
192	RDC F à K	08/09/09	17/09/09		8
195	SECHAGE RDC F à	18/09/09	12/10/09		17
210	R+1 F à K	22/09/09	01/10/09		8
211	SECHAGE R+1 F à	02/10/09	26/10/09		17
11 : PLOMBERIE - SANITAIRE					
137	BATI-SUPPORT WC	29/07/09	29/07/09		1
157	APPAREILLAGE R+	28/08/09	02/09/09		4
179	APPAREILLAGE RD	05/10/09	20/10/09		12
18	RESEAUX ENTERR	12/05/09	14/05/09		3
204	APPAREILLAGE RD	17/11/09	30/11/09		10
229	APPAREILLAGE R+	30/10/09	06/11/09		6
235	LOCAL TECHNIQUE	26/08/09	02/09/09		6
25	RESEAUX ENTERR	29/05/09	09/06/09		8
12 : CHAUFFAGE - VENTILATION					
107	RESEAUX RDC/R+1	24/06/09	14/07/09		15
109	RESEAUX RDC/R+1	13/07/09	07/08/09		20
114	RESEAUX RDC/R+1	22/07/09	04/08/09		10
121	RESEAUX RDC/R+1	24/07/09	06/08/09		10
132	RESEAUX RDC/R+1	28/07/09	04/08/09		6
144	CHAUFFERIE	10/07/09	07/09/09		42
145	PL. CHAUFFANT R+	30/07/09	06/08/09		6
147	SECHAGE/CHAUFF	14/08/09	07/09/09		17
158	APPAREILLAGE R+	28/08/09	02/09/09		4
162	MISE EN SERVICE	10/08/09	11/08/09		2
163	SECHAGE/CHAUFF	19/08/09	10/09/09		17
171	APPAREILLAGE RD	25/08/09	26/08/09		2
173	PL. CHAUFFANT R	19/08/09	24/08/09		4
176	SECHAGE/CHAUFF	31/08/09	22/09/09		17
189	APPAREILLAGE RD	22/09/09	23/09/09		2
191	PL. CHAUFFANT R	25/08/09	07/09/09		10
205	APPAREILLAGE RD	17/11/09	30/11/09		10
209	PL. CHAUFFANT R+	08/09/09	21/09/09		10
230	APPAREILLAGE R+	30/10/09	06/11/09		6
82	APPRO./RESEAUX	28/07/09	11/08/09		11
87	CFA/H CHAUFFERI	25/08/09	31/08/09		5
13 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES					
106	INCORPORATIONS	01/07/09	10/07/09		8
108	RESEAUX RDC/R+1	24/06/09	14/07/09		15
110	RESEAUX RDC/R+1	13/07/09	07/08/09		20
115	RESEAUX RDC/R+1	22/07/09	04/08/09		10
120	INCORPORATIONS	24/07/09	29/07/09		4
122	RESEAUX RDC/R+1	24/07/09	06/08/09		10
128	PANNEAUX PHOTO	27/08/09	03/09/09		6
133	RESEAUX RDC/R+1	28/07/09	04/08/09		6
136	INCORPORATIONS	28/07/09	26/08/09		22
139	LUSTRERIE FOYER	18/08/09	26/08/09		9
150	LUSTRERIE R+1 A	24/08/09	31/08/09		6
155	COFFRET R+1 A à	14/08/09	18/08/09		3
159	APPAREILLAGE R+	28/08/09	04/09/09		6
167	LUSTRERIE RDC A	21/08/09	27/08/09		5
169	COFFRET RDC A à	19/08/09	21/08/09		3
172	APPAREILLAGE RD	25/08/09	26/08/09		2
185	LUSTRERIE	03/09/09	10/09/09		6
186	COFFRET NOYAU	31/08/09	02/09/09		3
187	TSI/CMSI	31/08/09	03/09/09		4
190	APPAREILLAGE RD	22/09/09	25/09/09		4
193	TGBT	08/09/09	10/09/09		3
201	LUSTRERIE RDC F	23/09/09	30/09/09		6
202	COFFRETS RDC F	18/09/09	24/09/09		5
206	APPAREILLAGE RD	17/11/09	30/11/09		10
223	LUSTRERIE	15/10/09	22/10/09		6
227	COFFRET R+1 F à	02/10/09	06/10/09		3
231	APPAREILLAGE R+	30/10/09	06/11/09		6
61	INCORPORATIONS	21/07/09	10/08/09		15
76	PRISE DE TERRE	15/09/09	16/09/09		2
77	ECLAIRAGE PARKI	15/09/09	16/09/09		2
14 : CARRELAGE - FAIENCE					
153	FAIENCE R+1 A à D	14/08/09	14/08/09		1
165	PLINTHES RDC A à	19/08/09	21/08/09		3
174	SIPHONS SOL NOY	19/08/09	19/08/09		1
177	CARRELAGE RDC/	23/09/09	02/10/09		8
180	TAPIS SAS ENTRE	21/10/09	21/10/09		1
184	FAIENCE RDC/R+1	03/09/09	16/09/09		10
194	SIPHONS SOL RDC	25/08/09	25/09/09		1
196	CARRELAGE RDC	13/10/09	09/11/09		20
199	FAIENCE RDC F à	18/09/09	28/09/09		7
224	FAIENCE R+1 F à K	02/10/09	07/10/09		4
15 : PLAFONDS SUSPENDUS					
149	R+1 A à D	14/08/09	26/08/09		9
166	RDC A à D	19/08/09	26/08/09		6
200	RDC F à K	18/09/09	25/09/09		6
222	R+1 F à K	02/10/09	19/10/09		12
16 : SOLS COLLES					
151	R+1 A à D	08/09/09	15/09/09		6
212	ESCALIER INTERIE	20/10/09	26/10/09		5
213	R+1 F à K	27/10/09	09/11/09		10
17 : SERRURERIE					
113	GRILLES CHASSIS	30/07/09	03/08/09		3
125	GRILLES CHASSIS	28/07/09	28/07/09		1
127	GARDE-CORPS TOI	17/08/09	26/08/09		8
130	RDC PORTES EXTE	17/08/09	25/08/09		7
14	TRAPPE SILO BOIS	12/06/09	17/06/09		4
142	GARDE-CORPS TE	22/07/09	23/07/09		2
143	PORTE/CAILLEBOTI	08/07/09	09/07/09		2
207	GRILLE A ENROUL	18/09/09	22/09/09		3
232	SAS ENTREE	26/08/09	02/09/09		6
239	ESCALIER EXTERIE	07/09/09	18/09/09		10
41	OSSATURES MURS	06/07/09	10/07/09		5
48	GC/MC ESCALIER I	22/07/09	04/09/09		10
49	LUSTRE	05/08/09	06/08/09		2
60	EDICULE CONTAIN	31/08/09	04/09/09		5
70	VERROU PARKING	13/10/09	13/10/09		1
71	CLOTURE EST	29/09/09	12/10/09		10
88	GC/FILETS COURS	22/09/09	05/10/09		10
89	FILETS PARKING/G	06/10/09	19/10/09		10
90	PORTAILS TERRAIN	22/09/09	25/09/09		4
18 : PEINTURE					
141	PROJECTION RANG	22/07/09	24/07/09		3
152	R+1 A à D	14/08/09	31/08/09		12
16	PROTECTION CHAR	20/05/09	25/05/09		4
164	SOL RDC A à D	11/09/09	17/09/09		5
168	MURS RDC A à D	19/08/09	26/08/09		6
183	RDC/R+1 NOYAU C	31/08/09	21/09/09		16
197	RDC F à K	27/10/09	23/11/09		20
216	NETTOYAGES INTE	03/11/09	16/11/09		10
225	R+1 F à K	02/10/09	29/10/09		20
240	LETTRAGE ESCALI	07/09/09	08/09/09		2
241	PEINTURE TOUS O	07/09/09	18/09/09		10
27	PROTECTION CHAR	16/06/09	23/06/09		6
55	PROTECTION CHAR	24/07/09	27/07/09		2
91	LASURE CONTREPL	22/09/09	05/10/09		10
19 : ASCENSEUR					
126	MONTAGE	17/08/09	11/09/09		20
TOUS CORPS D'ETAT					
2	PERIODE DE PREP	18/02/09	17/03/09		20
