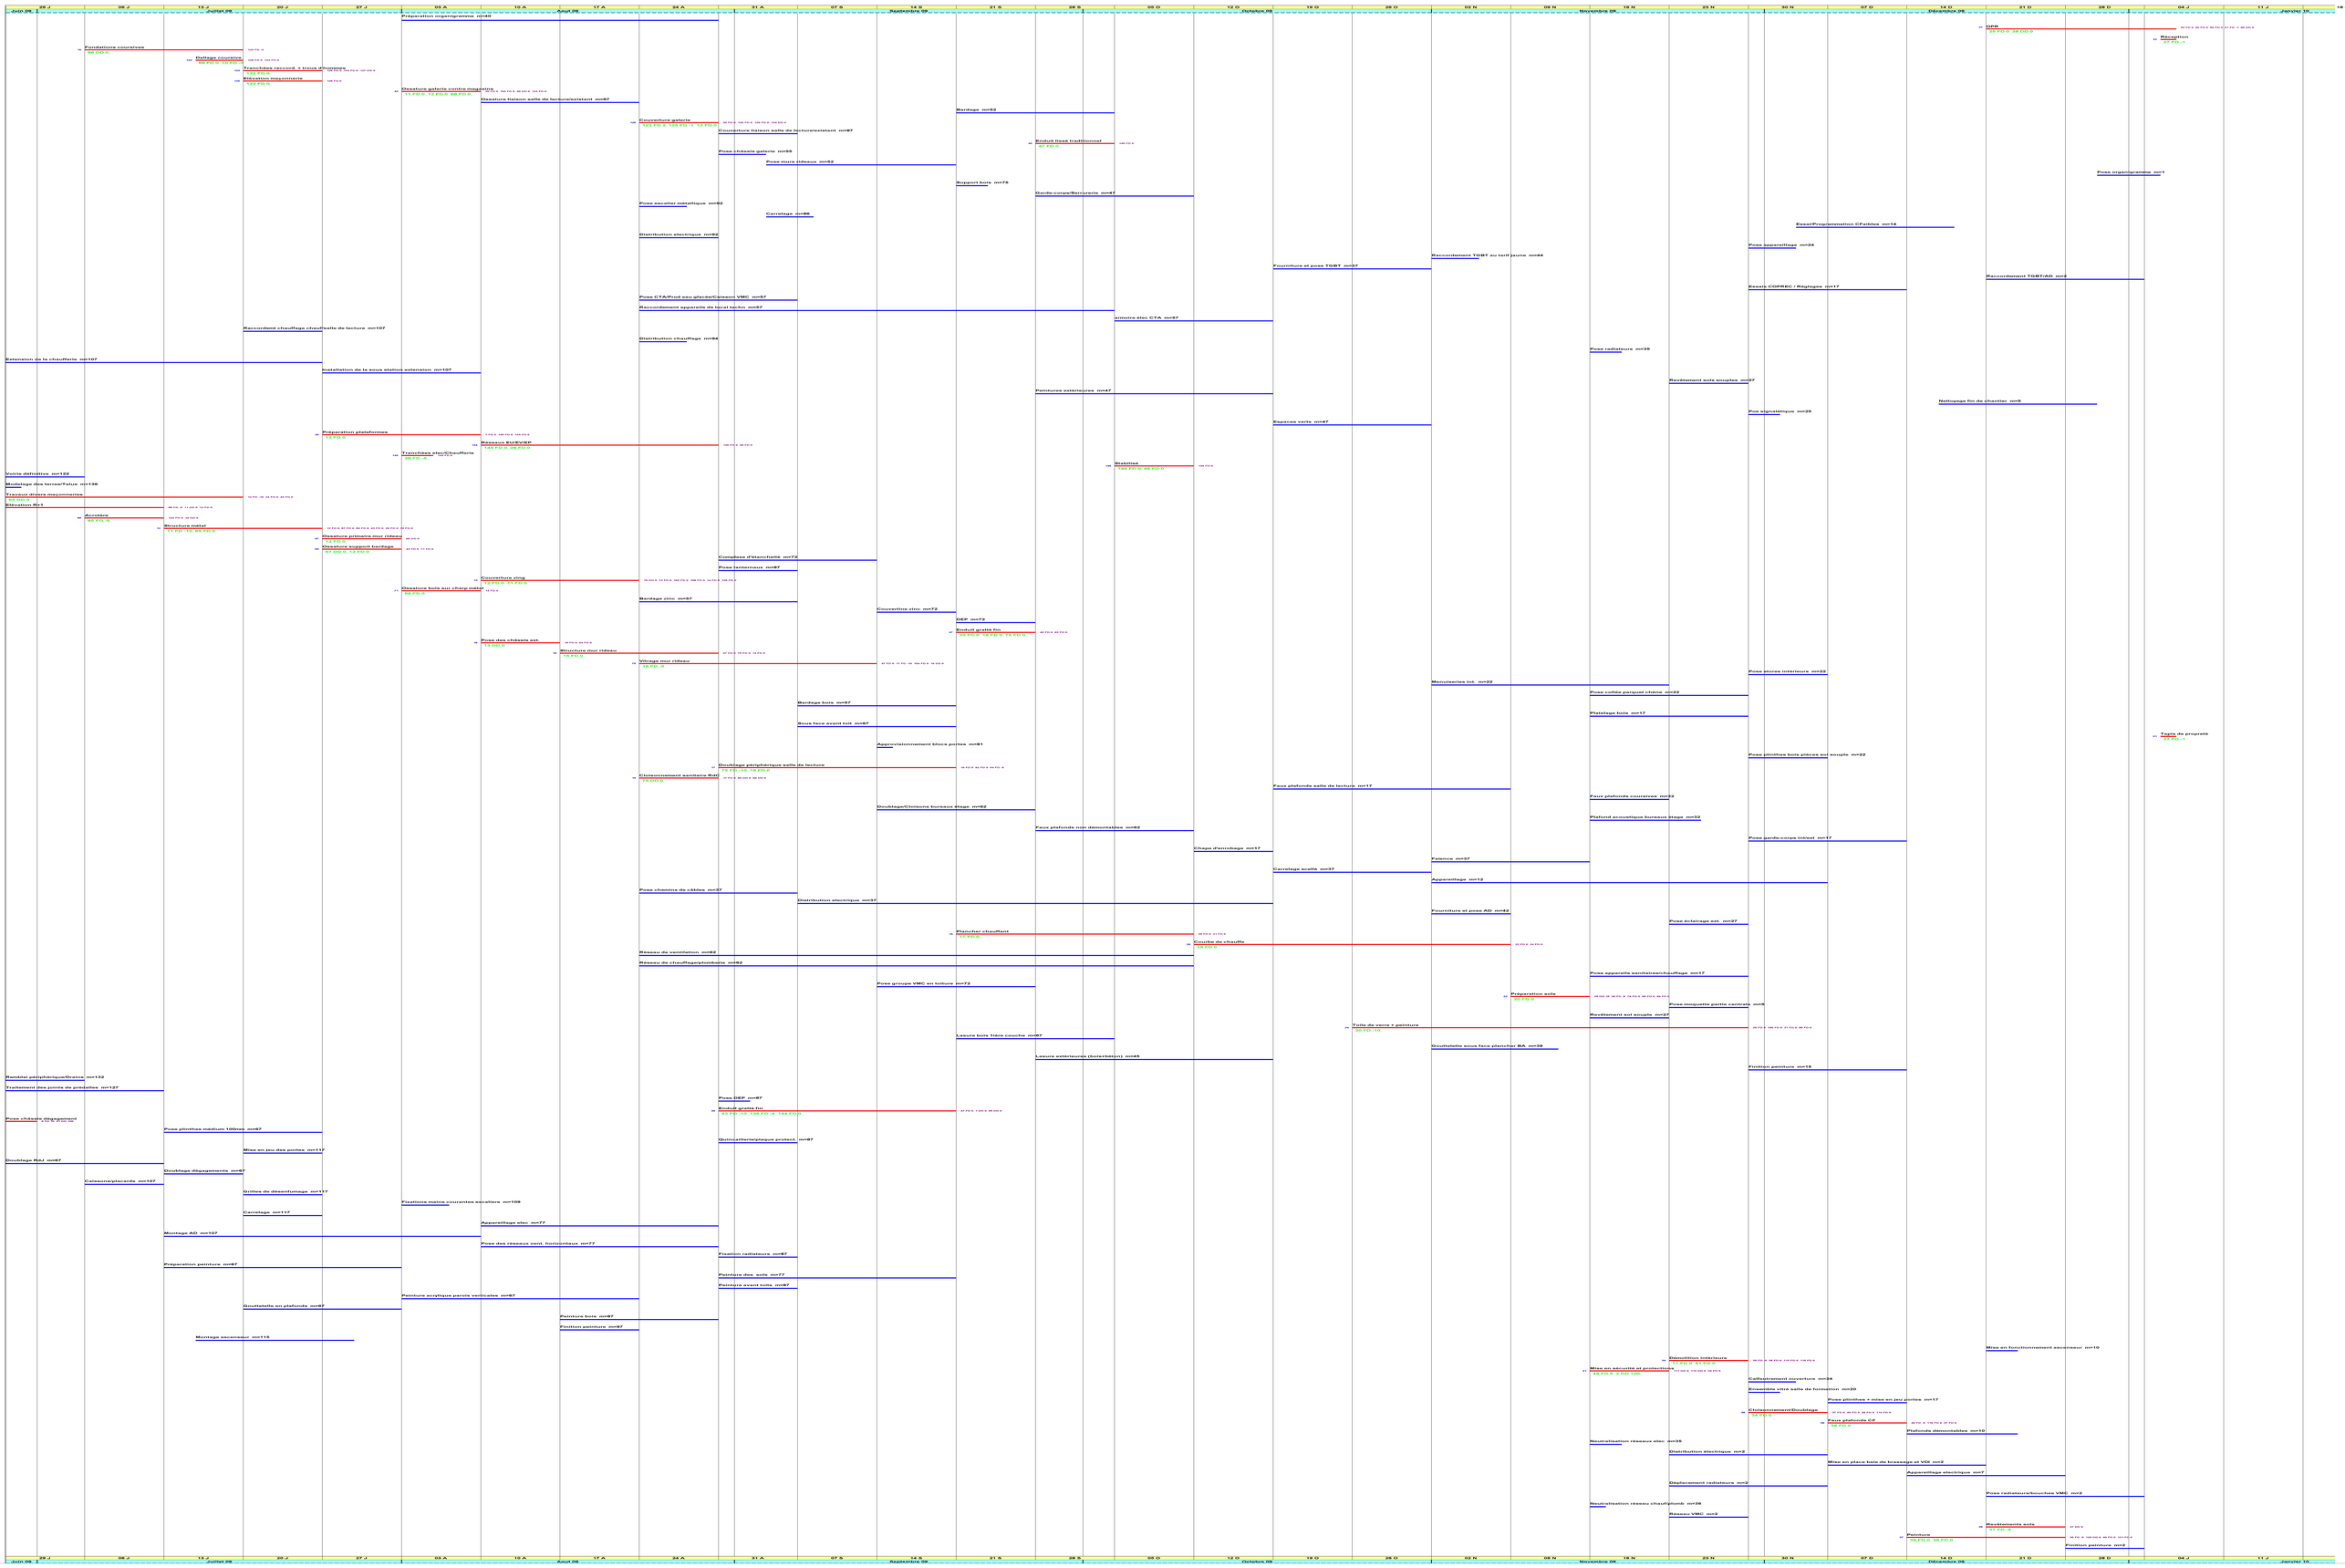
Juin 06
Juillet 06
Août 06
Septembre 06
Octobre 06
Novembre 06
Décembre 06
Janvier 07
Fondations courives
Dallage courives
Tranchées recond. + trous d'ancrage
Réalisation maçonnerie
Préparation organigramme m40
Ossature galerie contre magasin
Ossature liaison salle de lecture/restaurant m97
Couverture galerie
Couverture liaison salle de lecture/restaurant m97
Pose châssis galerie m59
Pose murs rideaux m52
Pose escalier métallique m92
Distribution electrique m92
Pose CTA/Prod eau glacée/Caisson VMC m57
Raccordement appareils de local techn. m97
Distribution chauffage m94
Raccordement chauffage chaufferie salle de lecture m107
Extension de la chaufferie m107
Installation de la sous station extension m107
Préparation plateformes
Tranchées elec/Chaufferie
Réseux EU/EVEP
Voirie définitive m122
Moulage des terrasse/faîtus m136
Travaux divers maçonnerie
Réception RI1
Acrotère
Structure métal
Ossature primaire mur rideau
Ossature support bardage
Couverture zing
Ossature bois sur charp métal
Pose des châssis alu
Structure mur rideau
Vitrage mur rideau
Bardage zinc m97
Bardage m52
Rapport bois m75
Garde-corps/Barrierate m47
Cerclage m98
Peintures extérieures m47
Espaces verts m47
Fourniture et pose TGBT m37
Armoire elec CTA m57
Statistics
Raccordement TGBT au tarif jaune m44
Pose radiateurs m35
Revêtement sols souples m27
Pose signalétique m25
Nettoyage fin de chantier m8
Pose organigramme m1
Essai/Programmation CFaibles m14
Pose appareillage m24
Essais CDPREC / Réglages m17
Raccordement TGBT/AD m2
DPE
Réception
Complexe d'étanchéité m72
Pose lanternaux m97
Couverture zinc m72
DEP m72
Enduit gratté fin
Bardage bois m97
Sous face avant toit m97
Approvisionnement blocs portes m91
Doublage périphérique salle de lecture
Cloisonnement sanitaire RdC
Doublage/Cloisons bureaux étage m92
Faux plafonds salle de lecture m17
Menuiseries int. m22
Pose coffre parquet chêne m22
Plateau bois m17
Faux plafonds courbes m32
Plafond acoustique bureaux étage m32
Pose plinthes bois pièces sol souple m22
Pose portes intérieures m22
Pose garde-corps intérieur m17
Tapis de propreté
Chape d'arrosage m17
Carrelage sol m37
Faïence m37
Appareillage m12
Pose chemin de câble m37
Distribution electrique m37
Fourniture et pose AD m42
Pose éclairage ext. m27
Plancher chauffant
Coudes de chauffe
Réseau de ventilation m92
Réseau de chauffage/plomberie m92
Pose groupe VMC en toiture m72
Pose appareils sanitaires/chauffage m17
Préparation sols
Pose moquette partie centrale m8
Revêtement sol souple m27
Toile de verre + peinture
Lasure bois 1ère couche m97
Lasure extérieure (isolation) m48
Goulotte sous face plancher BA m39
Finition peinture m15
Rondol pérphérique/Grains m132
Vantement des joints de préaffiche m127
Pose chassis dégagement
Pose plinthes médium 100mm m87
Mise en jeu des portes m117
Doublage RdJ m87
Doublage dégagements m87
Calesonsplacards m107
Grilles de désenfumage m117
Cerclage m117
Fixations mains courantes escaliers m109
Montage AD m107
Apparillage elec m77
Pose des réseaux vent, horizontaux m77
Préparation peinture m87
Fixation radiateurs m97
Peinture des sols m77
Peinture avant toits m97
Peinture acrylique parois verticales m87
Goulotte en plafonds m97
Peinture bois m97
Finition peinture m97
Montage ascenseur m115
Démolition intérieure
Mise en sécurité et protection
Calfeutrement ouverture m24
Ensemble vitré salle de formation m20
Pose plinthes + mise en jeu portes m17
Cloisonnement/Doublage
Faux plafonds CF
Plafonds démontables m10
Neutralisation réseaux elec m35
Distribution electrique m2
Mise en place bois de liaisage et VDI m2
Appareillage electrique m7
Déplacement radiateurs m2
Neutralisation réseau chauffe/ecs m38
Réseau VMC m2
Pose radiateurs/bouches VMC m2
Revêtements sols
Peinture
Finition peinture m2
Mise en fonctionnement ascenseur m10
